

18.01.2021

**WOCHENJOURNAL NR. 017**

---

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 017
- Berichtswoche: KW 45 + 46 (02.11.2020 bis 13.11.2020)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser / BL: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BL
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Stapfenweg bis Staufbergweg:
    - Ø Werkleitungsarbeiten ATB Medienrohr, Elektro, etc. inkl. neuer Kabelschächte abgeschlossen
    - Ø Neue EW-Verteilkabine Lenzburgerstrasse 12 aufgestellt und in Betrieb
    - Ø Strassenentwässerung (SA) erstellt
    - Ø Kandelaber Fundamente versetzt
    - Ø Verkabelungsarbeiten Elektro durch TBS abgeschlossen
    - Ø Abbruch / Rückbau Umgebung Trafostation Ausserdorf
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
    - Ø Sperrung Staufbergweg Mo, 16.11.2020 bis Fr, 27.11.2020
    - Ø Werkleitungsarbeiten Wasser, Gas, Elektro, etc. im Bereich Einlenker Staufbergweg
    - Ø Versetzen Randabschlüsse Kreisel – Staufbergweg
    - Ø Belagsarbeiten ca. ab Mo, 07.12.2020
    - Ø Sondierschlitze für Beprobung best. Fundationsmaterial Bauphase 4-6 ab Fr, 20.11.2020
- Technisches:
- Gasleitung wurde beim Kreisel Kehrbrunnen zusammengeschlossen und die Zwischen-Druckprüfung durchgeführt.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Bauen ist Vertrauen.

Notter Tiefbau AG, Wohlen

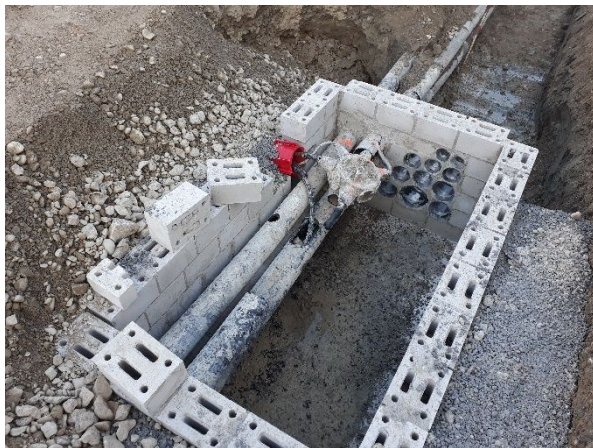


Abb. 1: Erstellung EW-Kabelschächte



Abb. 2: Grabenaushub für Verkleitungen Elektro + ATB-Medienrohr



Abb. 3: Anschluss und Versetzen EW-Verteilkabine



Abb. 4: Versetzen Entwässerungsschächte Schluck + Strassenablauf



Abb. 5: Freilegen best. EW-Schacht Staufbergweg



Abb. 6: Abhumusieren Rabatte Trafostation Ausserdorf
