

18.01.2021

WOCHENJOURNAL NR. 020

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 020
- Berichtswoche: KW 51 + 52 (14.12.2020 bis 22.12.2020)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser / BL: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BL
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Einbau Asphalttragschicht Fahrspur und Gehweg Richtung Staufen mit Mischgutprüfung
 - Ø Diverse Nachbearbeitungsarbeiten Schachtabdeckungen ziehen, etc.
 - Ø Aufstellen der neuen Kandelaber
 - Ø Phasenumstellung innerhalb der Bauphase 3 von Süd nach Nord
 - Ø Diverse Abschlussarbeiten zur Winterpause wie Belagsanrampungen. Baustellenabschränkung, Reinigungen, etc.
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.4 Nord – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Werkleitungsarbeiten Swisscom Hüttmattstrasse bis Schopfweg
 - Ø Versetzen Schluckschächte für Strassenentwässerung
 - Ø Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse Fahrbahn und Gehweg
 - Bauphase 4.1 Nord – Etappe Staufbergweg bis Grütstrasse:
 - Ø Rodungsarbeiten im Bereich Gehweg
 - Ø Demontage best. Kandelaber
 - Ø Werkleitungsarbeiten ATB-Medienrohr und Elektro im Bereich Gehweg
 - Ø Erstellung Spezialbauwerk / Kabelschacht Elektro vor Trafostation Ausserdorf
- Technisches:
- Die Baustelle befindet sich zwischen Mi, 23.12.2020 bis und mit Fr, 08.01.2021 in der Winterpause. Am Mo, 11.01.2021 wird der Baustellenbetrieb wieder aufgenommen.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Einbau Asphalttragschicht Fahrspur Richtung Staufen



Abb. 2: Walzen der eingebauten Asphalttragschicht in der Fahrspur



Abb. 3: Eingebaute Asphalttragschicht Gehweg



Abb. 4: Einbau Sauberkeitsschicht Zu-/ und Ausfahrten Querstrassen



Abb. 5: Phasenumstellung innerhalb Bauphase 3 von Süd nach Nord inkl. neu aufgestellter Kandela-ber

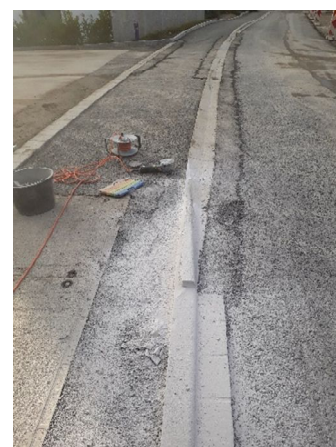


Abb. 6: Diverse Nachbearbeitungen wie stocken der Randabschlussübergängen
