

**DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT**
Abteilung Tiefbau

Newsletter Nr. 6 zum kantonalen Bauprojekt Ostumfahrung Bad Zurzach

1. Projektstand

Orthofoto

Das Bild der letzten Flugaufnahme vom 29.04.2022 liegt dem Newsletter bei.

Knoten Glocke

Die Arbeiten sind mit Ausnahme der Deckbelagsarbeiten und der Lichtsignalanlage abgeschlossen.

Tunnel

Die Arbeiten für den Tagbautunnel schreiten programmgemäss voran. Die Baumeisterarbeiten im Tunnel stehen kurz vor dem Abschluss und der aufgehellte Deckbelag konnte am 13. Juni 2022 eingebaut werden.

Die Strassenbau- und Umgebungsarbeiten auf dem Tunnel im Bereich Schützenweg sind weit fortgeschritten.

Zurziberg

Die Kunstbauten im Bereich des Knoten Zurziberg sind erstellt.


Die Strassenbauarbeiten im Bereich des zukünftigen Knoten Zurziberg sind mit Ausnahme des Deckbelags ausgeführt.

In der Vorzone Zurziberg sind die Strassenbauarbeiten mit Ausnahme des Deckbelags ausgeführt. Die Lärmschutzwand aus Holz wurde montiert.

2. Baustellenimpressionen



Tunnel nach Einbau Sohlspriessplatte und Anprallwand

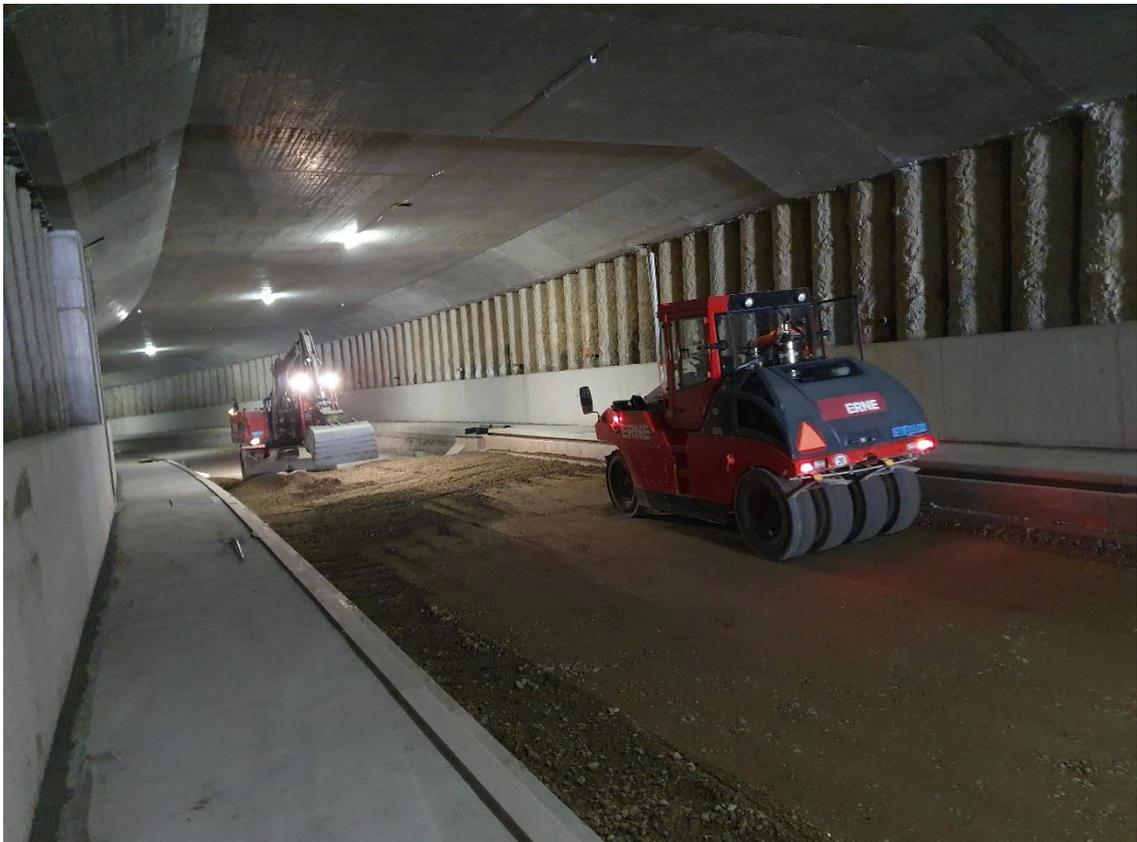

Einbau Strassenkoffer Tunnel




Bau Bankette



Einbau Tragschicht Tunnel mit Beschicker und Einbaufertiger



Verdichten Tragschicht Tunnel

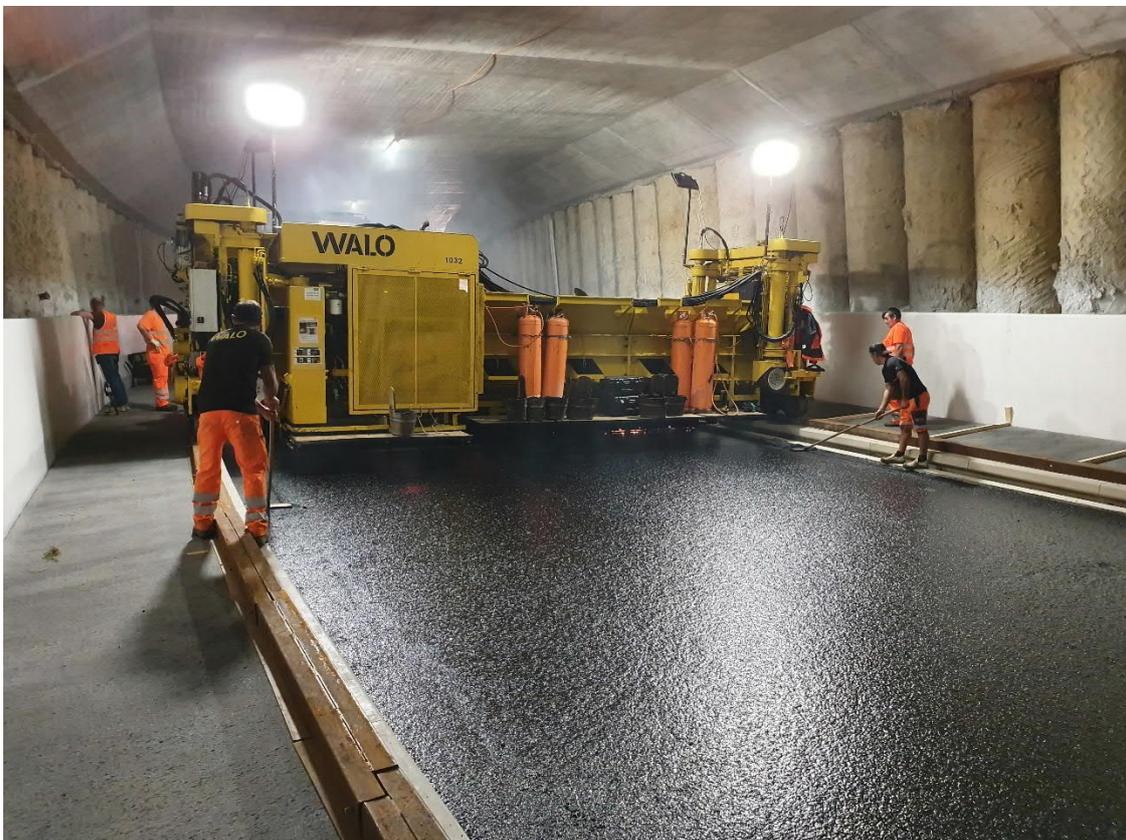

Einbau Gussasphalt Binderschicht



Einbau Gussasphalt Deckschicht



Heller Deckbelag Tunnel



Vorzone Zurziberg mit Lärmschutzwand



Knoten Glocke



Schützenweg

3. Ausblick

Folgende Arbeiten werden in nächster Zeit ausgeführt:

Knoten Glocke

- Einbau Deckbelag Strasse 20. Juni – 8. Juli 2022
- Montage Tragwerke Lichtsignalanlage Herbst 2022

Tunnel

- Montage Wandverkleidung Tunnel ab 11. Juli 2022
- Montage Stahltreppen Notausgänge ab 11. Juli 2022

Knoten Zurziberg

- Einbau Deckbelag Strasse Wochenende 20./21. August 2022
- Montage Tragwerke Lichtsignalanlage Herbst 2022

Betriebs- und Sicherheitsausrüstung Tunnel (Beleuchtung, Lüftung, Überwachung):

- Beginn Installation im Tunnel Sommer 2022

4. Meilensteine

- Baubeginn: 13.01.2020
- Beginn Sperrung Knoten Glocke: 03.02.2020
- Erstellen 1. Bohrfahl Tunnelwand 12.02.2020
- Betonieren 1. Deckenetape 20.04.2020
- Versetzen SBB- und Fussgängerbrücke: 20./21.06.2020
- Inbetriebnahme Knoten Glocke: 20.11.2020
- letzter Bohrfahl Tunnelwände 01.03.2021
- Betonieren letzte Deckenetape: 02.06.2021
- Durchstich Tunnelaushub 20.08.2021
- Einbau Deckbelag Tunnel 13.06.2022
- Fertigstellung Rohbauarbeiten: Sommer 2022
- Tunnelausrüstung: Herbst 2022 – Frühjahr 2023
- Deckbelag, Markierung, Inseln: Sommer 2022
- Inbetriebnahme Ostumfahrung: Frühjahr 2023

5. Verkehrsführung

Mit den bevorstehenden Deckbelagsarbeiten sind verschiedene Strassensperrungen verbunden. Witterungsbedingte Terminanpassungen sind möglich.

Bereich Knoten Glocke

Für die Deckbelagsarbeiten wird die Zürcherstrasse von der Einmündung Breitestrasse bis zum Zoll vom 20.06.2022 bis 08.07.2022 für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Zufahrt von der Zürcherstrasse in die Breitestrasse und in die Bahnhofspange ist immer möglich. Es handelt sich um die gleiche Sperrung wie im Jahr 2020 und die Umleitung für den motorisierten Verkehr erfolgt wieder über die Nordumfahrung.

Bereich Breitestrasse

Die Breitestrasse wird im Abschnitt Promenadenstrasse bis zur Grundstücksgrenze Breitestrasse 2/4 vom 11.07.2022 bis 22.07.2022 für den Verkehr gesperrt. Der Durchgang für Fussgänger ist möglich. Die Zufahrt in das Breitequartier erfolgt während dieser Zeit über die Neubergstrasse zur Beckenmoosstrasse.

Bereich Knoten Zurziberg

Die Belagsarbeiten im Knoten Zurziberg finden von 08.08.2022 bis 03.09.2022 statt. Zuerst starten die Belagssanierungen der Bruggerstrasse angrenzend zum Projekt Ostumfahrung bergaufwärts, wobei der Verkehr mittels mobilen Lichtsignalanlagen für ca. 200m einspurig geführt wird. Die Deckbelagsarbeiten der Ostumfahrung sind für das Wochenende 20./21.08.22 geplant, wobei die Bruggerstrasse für sämtlichen Verkehr gesperrt wird. Die Busverbindung zwischen Tegerfelden und Bad Zurzach wird umgeleitet (Detailinformationen gemäss Postauto AG). Die Umleitung für den MIV wird signalisiert und erfolgt über Koblenz. Die Sperrung erfolgt ab Freitagabend 19.08.2022, ca. 21.30 Uhr, nachdem am Freitag der letzte Bus durchgefahren ist. Der Verkehr wird am Montagmorgen 22.08.2022, 05.00 Uhr für alle Verkehrsteilnehmer wieder freigegeben.

Bad Zurzach, 21. Juni 2022

Guido Sutter
Projektleiter
