Muster für einen Zeitplan

Anhang 3 zu den Richtlinien der Rechtssetzung

1.8 Projekt Revision Gesundheitsgesetz

Planung GD

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**Impulsphase**	**Mo 09.08.04**	**Mo 24.01.05**	**115 t**
2	Auswertung bestehende Daten RD	Fr 27.08.04	Mo 06.09.04	7 t
3	Brainstormings	Di 21.09.04	Di 09.11.04	36 t
4	Erstellen Mängelkartei	Di 07.09.04	Mo 08.11.04	45 t
5	Abschluss Mängelkartei	Mi 10.11.04	Mi 10.11.04	1 t
6	Entwurf Projektvereinbarung	Mo 09.08.04	Do 26.08.04	14 t
7	Überarbeitung Projektvereinbarung	Do 11.11.04	Fr 17.12.04	27 t
8	1. Projektstatusbericht	Mo 20.12.04	Mo 20.12.04	1 t
9	DV Verabschiedung Projektvereinbarung	Mo 20.12.04	Mo 24.01.05	4 W
10	**Konzeptphase**	**Di 25.01.05**	**Mi 16.08.06**	**390 t?**
11	**Normkonzept**	**Di 25.01.05**	**Do 22.06.06**	**353 t?**
12	Einteilung Mängelkartei und Arbeitsgruppent	Di 25.01.05	Do 27.01.05	3 t
13	Beschreibung des IST-Zustandes	Fr 28.01.05	Do 10.02.05	10 t
14	Variantendiskussion	Fr 28.01.05	Mi 21.12.05	228 t
15	Einbezug der wichtigen Verbände	Mo 26.09.05	Di 06.12.05	52 t?
16	2. Projektstatusbericht	Di 24.05.05	Di 24.05.05	1 t?
17	3. Projektstatusbericht	Di 11.10.05	Di 11.10.05	1 t?
18	4. Projektstatusbericht	Mi 21.12.05	Mi 21.12.05	1 t?
19	Variantenwahl DV	Do 22.12.05	Fr 27.01.06	22 t
20	Verfassen Normkonzept	Mo 02.01.06	Do 22.06.06	120 t
21	**Genehmigung Normkonzept**	**Fr 23.06.06**	**Mi 16.08.06**	**37 t**
22	Genehmigung Entwurf durch DV	Fr 23.06.06	Mi 28.06.06	4 t
23	Mitberichtsverfahren	Do 29.06.06	Do 27.07.06	20 t
24	Bereinigung Normkonzept	Fr 28.07.06	Di 15.08.06	12 t
25	Genehmigung Normkonzept durch RR / Ausl	Mi 16.08.06	Mi 16.08.06	1 t
26	**Entwurfphase**	**Do 17.08.06**	**Mi 15.11.06**	**65 t**
27	Redaktion Vorentwurf	Do 17.08.06	Mi 13.09.06	20 t
28	Redaktion Vernehmlassungsbeleitbericht	Do 14.09.06	Mi 27.09.06	10 t
29	Departementsinterne Überprüfung	Do 28.09.06	Di 03.10.06	4 t
30	Freigabe durch DV	Mi 04.10.06	Do 05.10.06	2 t
31	Mitberichtsverfahren	Fr 06.10.06	Do 02.11.06	20 t
32	Differenzbereinigung	Fr 03.11.06	Do 09.11.06	5 t
33	Beschluss Freigabe DV	Fr 10.11.06	Di 14.11.06	3 t
34	Beschluss Freigabe Vernehmlassungsbericht durc	Mi 15.11.06	Mi 15.11.06	1 t
35	**Vernehmlassungsphase**	**Do 16.11.06**	**Mi 16.05.07**	**123 t**
36	Durchführung des Verfahrens	Do 16.11.06	Mi 17.01.07	40 t
37	Auswertung	Do 18.01.07	Mi 14.02.07	20 t
38	Verarbeitung der Ergebnisse	Do 15.02.07	Mi 28.02.07	10 t
39	Botschaftsentwurf 1. Beratung	Do 01.03.07	Fr 13.04.07	30 t
40	Freigabe durch DV	Mo 16.04.07	Mo 16.04.07	1 t
41	Mitberichtsverfahren	Di 17.04.07	Mo 14.05.07	20 t
42	Beschluss zur Übergabe an GR	Di 15.05.07	Di 15.05.07	1 t
43	Genehmigung Gesetzesentwurf und Botschaft dur	Mi 16.05.07	Mi 16.05.07	1 t
44	**Parlamentarisches Verfahren**	**Fr 18.05.07**	**Do 21.02.08**	**194 t**
45	Synopse zu den Antragen	Fr 18.05.07	Di 22.05.07	3 t
46	Stellungnahme RR	Mi 23.05.07	Mi 23.05.07	1 t
47	GR 1. Beratung Kommission und Plenum	Di 29.05.07	Di 11.09.07	75 t
48	Redaktion Botschaftsentwurf 2. Beratung	Mi 12.09.07	Mo 22.10.07	30 t
49	Freigabe Botschaftsentwurf durch DV	Di 23.10.07	Mi 24.10.07	2 t
50	Mitberichtsverfahren	Do 25.10.07	Di 27.11.07	24 t
51	Beschluss RR	Mi 28.11.07	Mi 28.11.07	1 t
52	GR 2. Beratung Kommission und Plenum	Di 04.12.07	Mo 04.02.08	40 t
53	Beschluss GR	Di 05.02.08	Di 05.02.08	1 t
54	Redaktionslesung	Mi 06.02.08	Do 21.02.08	12 t
55	**Volksabstimmung**	**Fr 22.02.08**	**So 01.06.08**	**72 t**
56	Redaktion Abstimmungsvorlagen	Fr 22.02.08	Fr 21.03.08	21 t
57	Genehmigung Abstimmungsbroschüre durch RR	Mi 26.03.08	Mi 26.03.08	1 t
58	Druck und Versand an Gemeinden	Do 27.03.08	Fr 04.04.08	7 t
59	Volksabstimmung	So 01.06.08	So 01.06.08	1 t
60	Referendumsfrist	Fr 22.02.08	Do 15.05.08	3 M
61	Ende des Projekts Revision GesG	Mo 02.06.08	Mo 02.06.08	1 t
62	**Überarbeitung der Verordnungen**	**Mi 12.09.07**	**Fr 15.08.08**	**12 M**
63	**Inkraftsetzung**	**Mo 18.08.08**	**Fr 12.09.08**	**20 t**
64	früheste Inkraftsetzung und Publikation	Mo 18.08.08	Fr 12.09.08	1 M

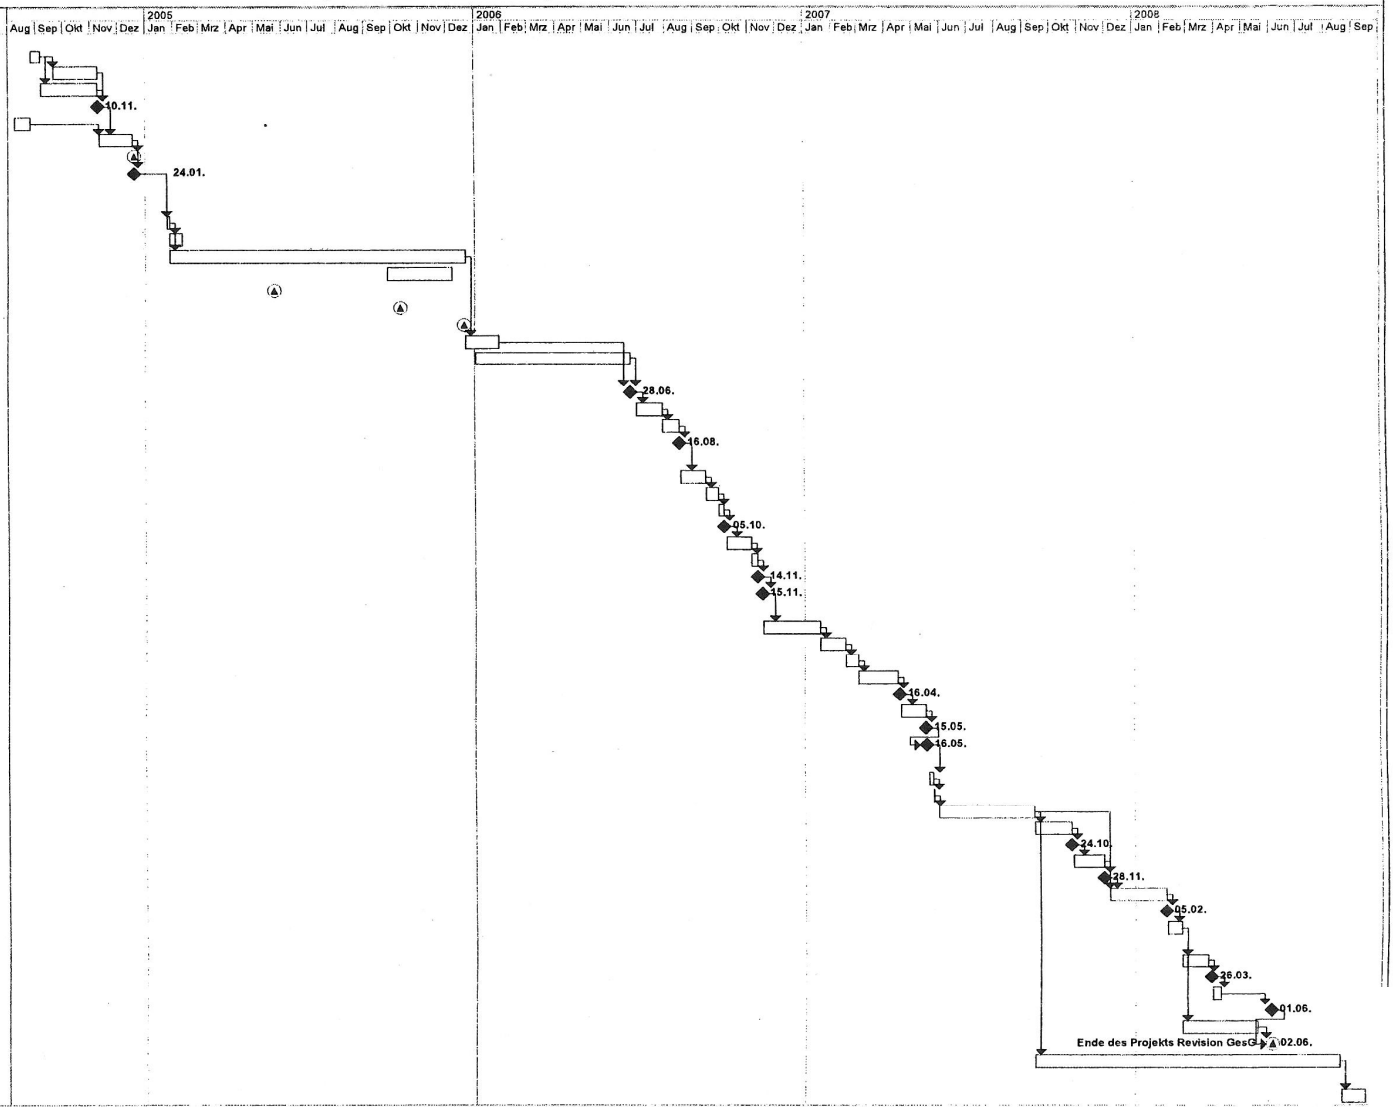

500.1.07 Revision Gesundheitsgesetz
Aktualisierung: Mo 27.02.06

Normal ◆ Entscheid DV ◆ Entscheid RR ◆ Entscheid GR ◆ Bericht DV ▲ Abteilung ▭ Extern ▭ Grossrat ▭ Unterbrechung

GSC

1 //
